«УТВЕРЖДАЮ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение бытовок для круглогодичного проживания рабочих
на объект: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»
2	Наименования и местонахождения организации.	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
5	Для каких целей заказываются услуги.	Бытовки для круглогодичного проживания рабочих
6	Техническое описание и объем	Бытовки, объединенные в единое жилое помещение, предназначенные для круглогодичного проживания сотрудников в количестве 30 человек, оснащенное необходимым для проживания оборудованием: 1. Фундамент: Опорно-столбчатый состоящий из бетонных блоков 20х20х40 - 28 шт. либо свайно-винтовой с применением гидроизоляции под обвязку (заводская антикоррозийная обработка), **в стоимость включен.** 2. Обшивка внешняя, оцинкованный металлический профлист С- 8, 075 мм, с полимерным покрытием Цвет: RAL 1014 слоновая кость. 3. Крыша двускатная: Профнастил с 21,0.45 мм, с полимерным покрытием RAL 8017 коричневый, подшив торца профлист белый RAL 9003, гидроветроизоляционная пленка Изоспан, пароизоляционная пленка Изоспан, утеплитель Минеральная вата 100 мм Технониколь, полууши для транспортировки. 4. Верхняя и нижняя обвязка: гнутый швеллер 120х50х3 мм., грунтован. 5. Стойка: швеллер 100х50х3 мм, грунтован. 6. Обрешетка: проф. труба 50х50х3 мм, грунтован 7. Сетка от грызунов ОЦ ЦПВС "Антимышка Стандарт" 6х6 мм. 8. Дверь входная:Толщина полотна (мм): 40, толщина металла (мм): 0,3, замок- 1 шт. – 1 цилиндровый, 4 точки запирания, комплект ключей, Уплотнитель на дверь: 1 контур уплотнения 2050х900 мм. – **1 шт.** 9. Окна: 1000х1000 - **12 шт**. Профиль REHAU (москитная сетка, поворотно-откидной механизм), 500х500 – **2 шт**. (москитная сетка, поворотно-откидной механизм) 10. Пол: гидроветроизоляционная пленка Изоспан, пароизоляционная пленка Изоспан. Утеплитель Минеральная вата 100 мм Технониколь, фанера влагостойкая 15мм, линолеум ПВХ Парма Аршан -цвет: под дерево светлый дуб, плинтус ПВХ с углами.

		11. Внутренняя обшивка: Ветрозащитная полиэтиленовая мембрана Изоспан, Утеплитель Минеральная вата 100 мм Технониколь, вагонка класса АВ. 12. Сан. Узел: Стены, пол, потолок - ПВХ панели белый RAL 9016, на пол линолеум. 13. Мебель для ванной комнаты: Поддон душевой 80х80 – 5 шт., унитаз - 5 шт., раковина - 6 шт., кран для раковины - 6 шт., кран для душа с душевой лейкой - 5 шт., полотенцесушитель электрический дуга – 6 шт. 14. Водопроводная и канализационная система: под ключ. 15. Закладная под бойлер – 4 шт. 16. Водонагреватель накопительный, объем 100 л., Макс. мощность электрическая – 1500 Вт, максимальная температура нагрева воды - 70 °С - 4 шт. 17. Дверь межкомнатная: МДФ светлый дуб (ручка, замок в комплекте) – 14 шт. 18. Электрика: кабель 3х4 ГОСТ в кабельканале, укладка внешняя, автомат 24 А - 14 шт., светильник ЛЕД – 28 шт., выключатель – 14 шт., розетка двойная -36 шт., розетка одинарная под кондиционер и бойлер – 16 шт. 19. Закладная под сплит-систему – 12 шт. 20. Сплит-система для обогрева зимой и охлаждения летом – 12 шт. 21. Коридор общий: идентично комплектующим бытовкам
7	Условия доставки и сборки	Доставка и сборка – силами и за счет Поставщика
8	Сроки выполнения работ.	Май- Июль 2024 г.

Ответственный : Краснобаев А.В.
Krasnobaev.AVL@ahstep.ru
+79624220619

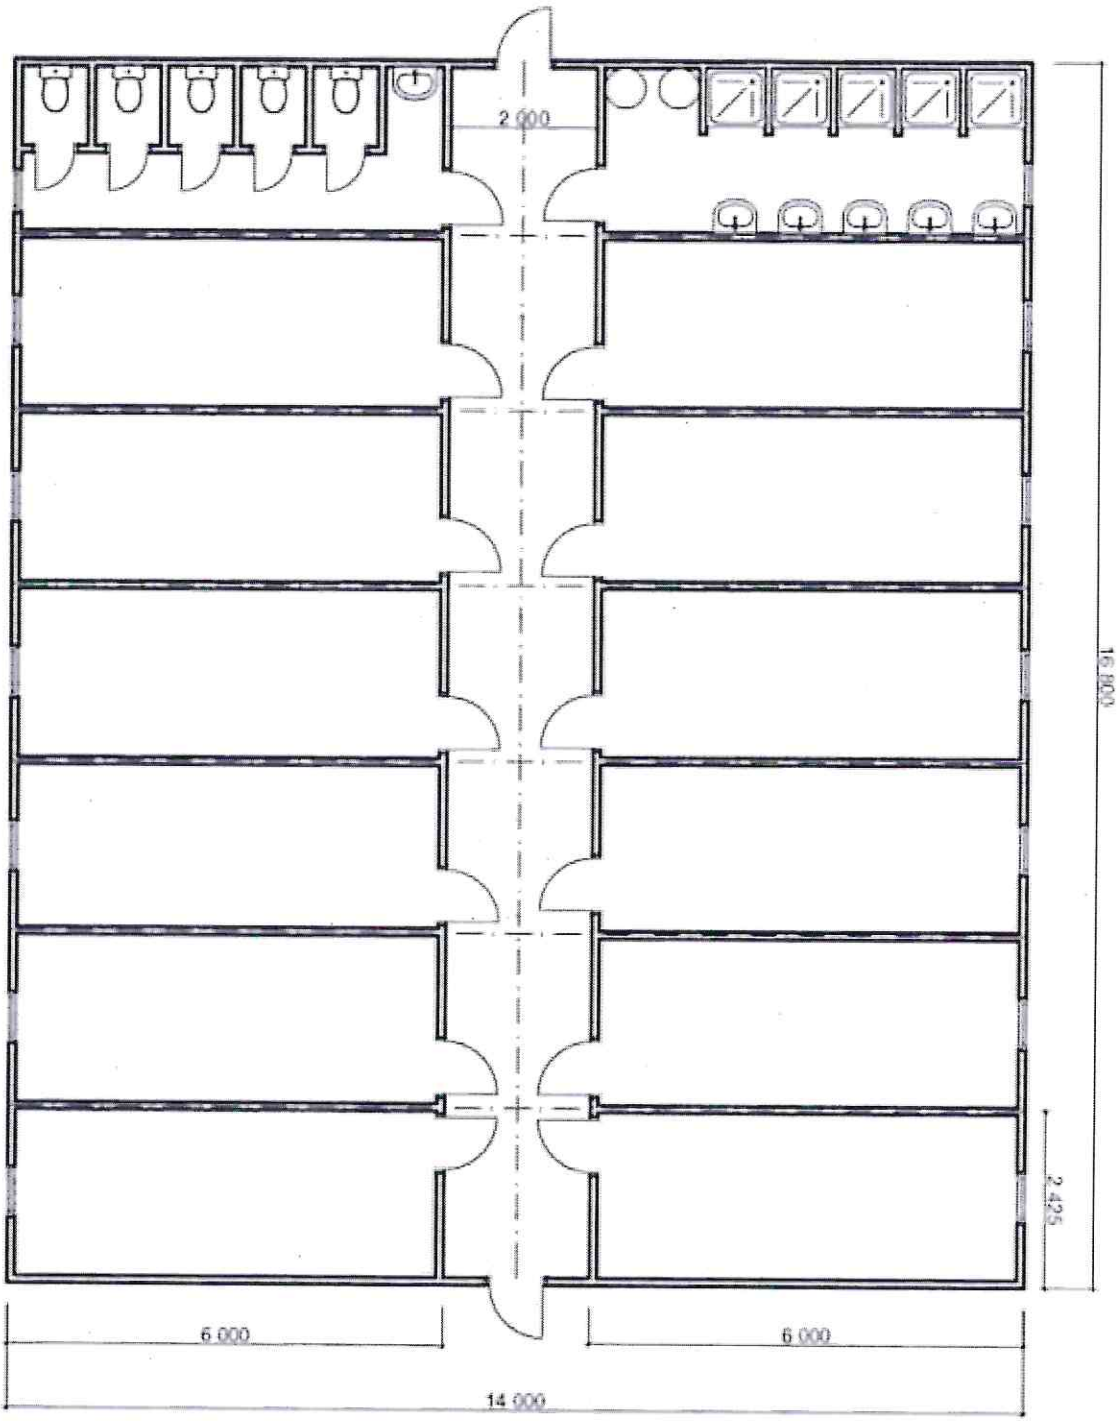
2 000
16 800
2 425
6 000
6 000
14 000
